

旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和7年3月時点)

次回更新予定
令和7年5月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡ (多目的グラウンドB含む)

【今月の主な工事内容】

管理棟	建屋解体、土間・基礎(地下)解体
管理棟脱臭室	アスベスト対策、煙突解体・撤去、
洗車場	地中構造物撤去
多目的グラウンドB	埋戻し・整地

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】

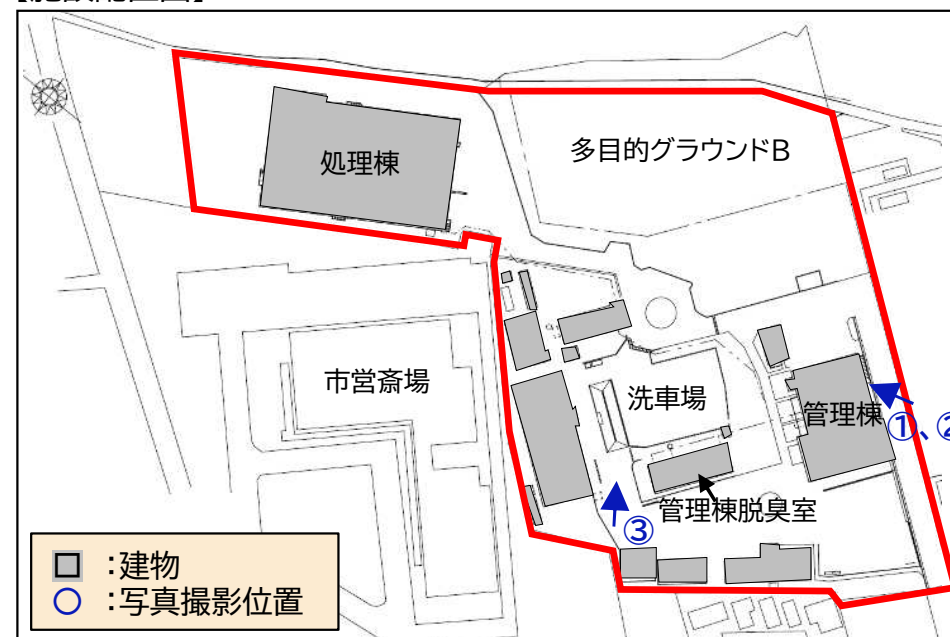

※建物、地中構造物の解体状況は次ページをご確認ください。

【状況写真】

①、② 管理棟

管理棟の建屋解体が終了したため、現在、土間・基礎(地下)解体を行っています。
地下には深さ6mの水槽があることから、スロープを造成し、地下へ下りながら解体作業を進めています。
管理棟地下の解体については、5月中旬までを予定しています。




③ 管理棟脱臭室

管理棟脱臭室について、アスベスト対策を行った後に、煙突を解体し、撤去しました。
4月に、建屋解体、土間・基礎(地下)解体を予定しています。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和7年3月時点)

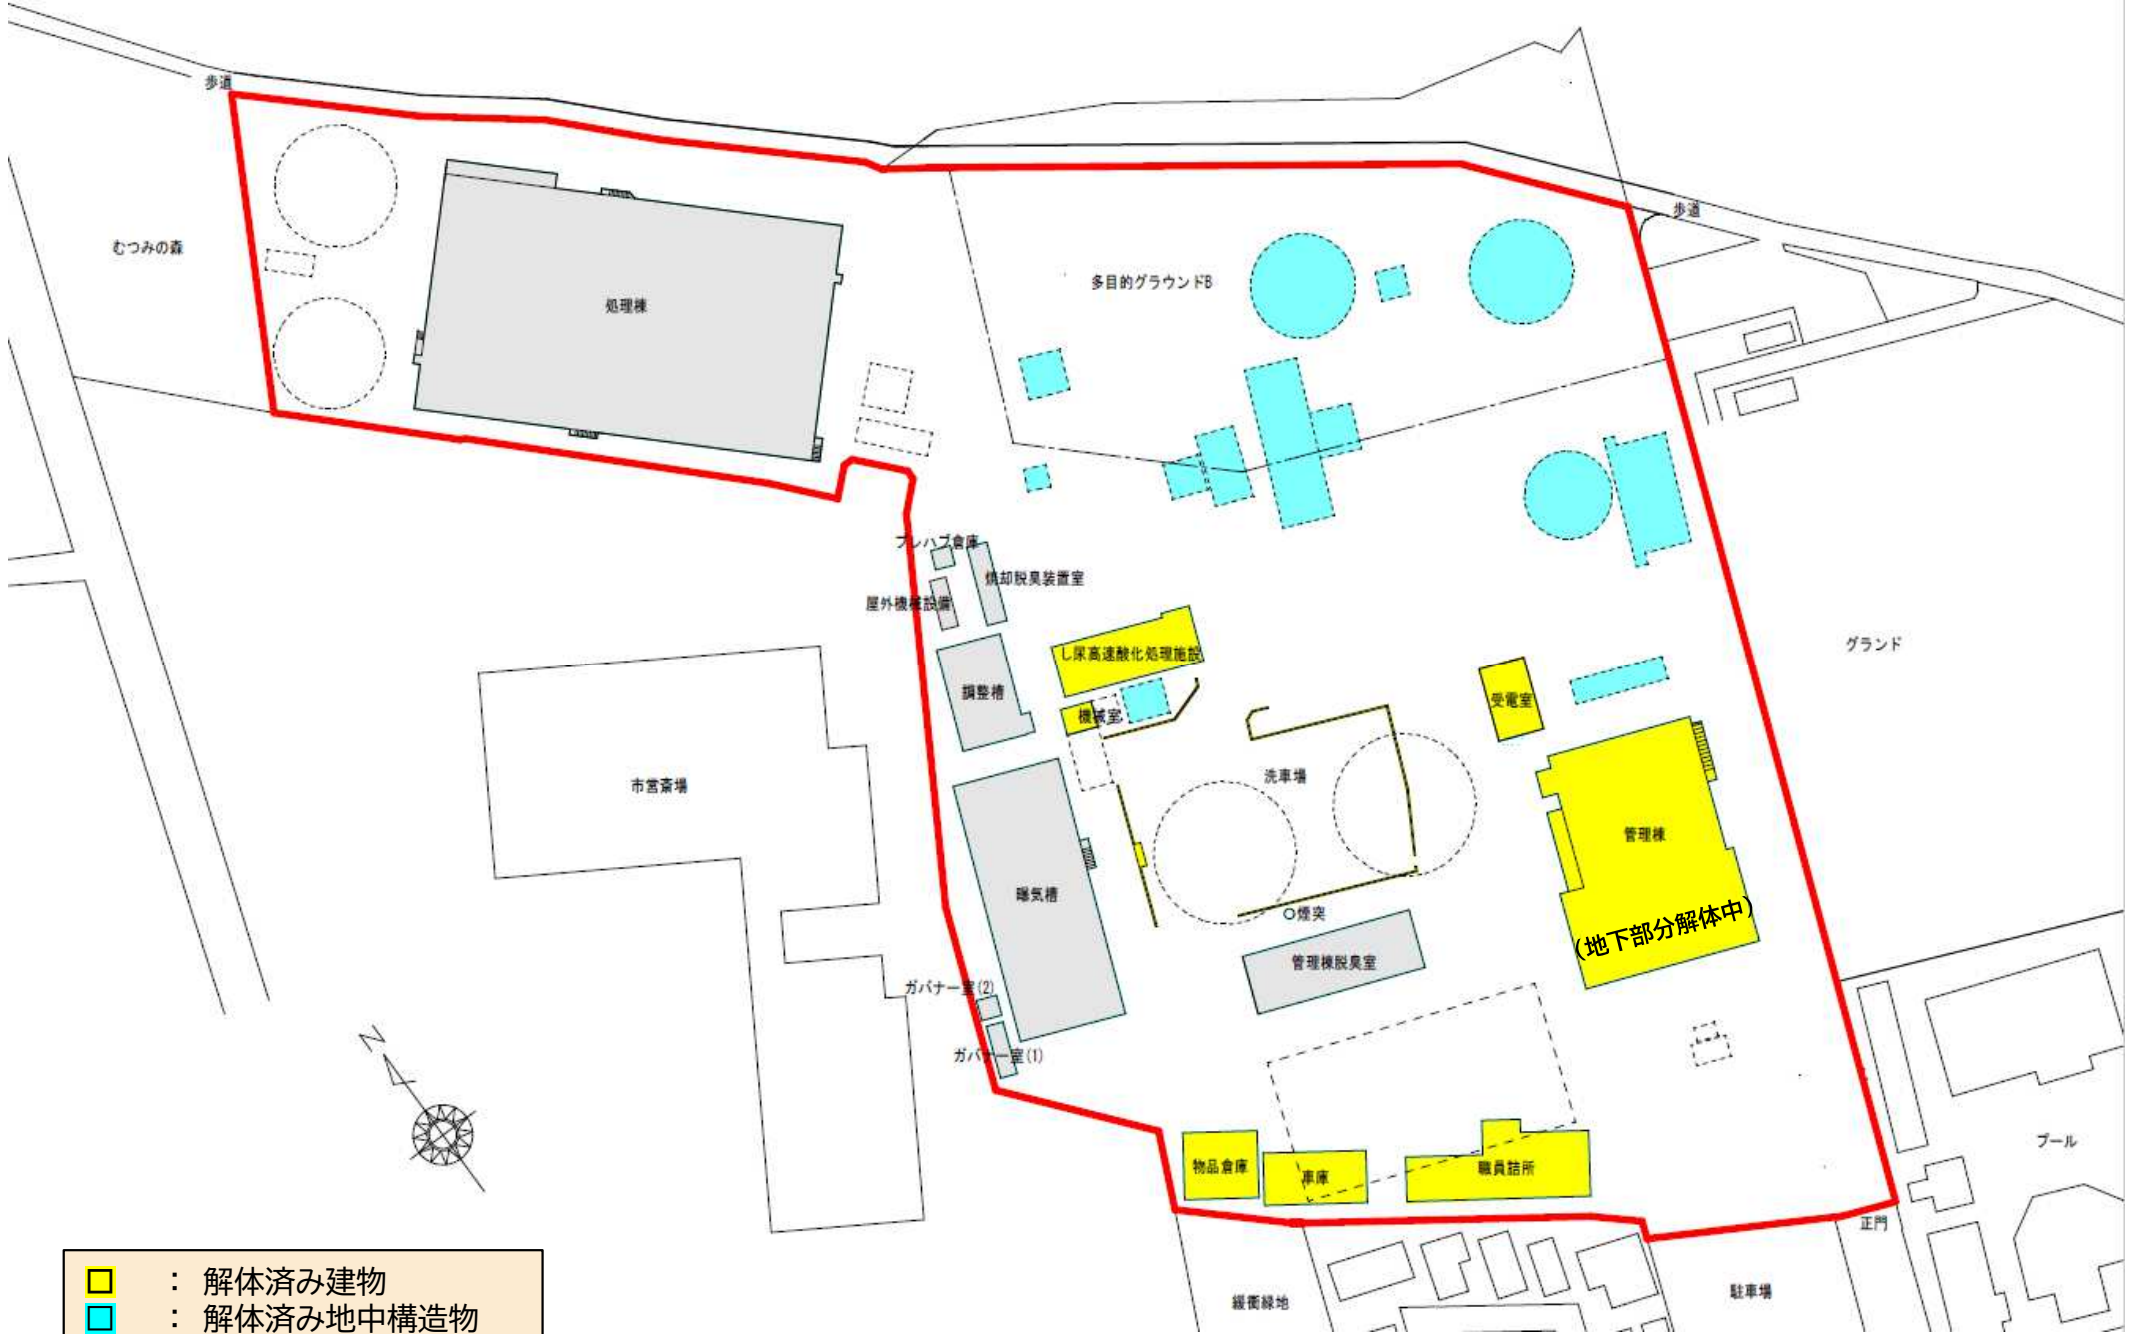

- : 解体済み建物
- : 解体済み地中構造物
- : 建物
- 点線 : 地中構造物

管理棟脱臭室 煙突の解体について

1. 煙突の解体について

煙突の断熱材に石綿(アスベスト)の使用が確認されたため、負圧隔離養生等の飛散防止対策を講じた上で撤去作業を行いました。

作業に際しては、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定に則り、大気中の石綿の濃度(石綿繊維数及びその他繊維状粒子数)の測定を行いました。

2. 測定結果について

下表のとおり、全ての結果で1本/L未満となり、問題ありませんでした。
【基準:除去作業を行う場所の周辺で大気中の石綿の濃度が1本/L以下】

【測定地点】



実施時期	測定日	測定地点	測定結果
作業開始前	令和7月 2月22日(土)	敷地境界	1本/L未満
	令和7月 3月18日(火)	作業建物周辺	1本/L未満
作業中	令和7月 3月21日(金)	敷地境界	1本/L未満
		作業建物周辺	1本/L未満
		集じん機の排気口	1本/L未満
作業完了後	令和7月 3月29日(土)	敷地境界	1本/L未満
		作業建物周辺	1本/L未満
