

旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和8年9月時点）

次回更新予定
令和9年1月中旬

【令和8年8月以降の主な工事内容】

旧ごみ焼却施設	仮設テント設置工事
処理棟	設備撤去、建屋解体、土間・基礎(地下)解体

※ 解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【工程】

	令和8年			令和9年						
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
旧ごみ焼却施設										
処理棟										
埋戻し、整地 等										

※ 工期について、令和8年9月30日を予定していましたが、旧ごみ焼却施設の解体作業に伴い、**令和9年7月15日まで延長**とさせていただきます。

【状況写真】

① 旧ごみ焼却施設

旧ごみ焼却施設の解体に向け、粉じんなどが周辺に飛散しないよう仮設テントを設置し、隔離等の準備を進めています。今後、仮設テント内を負圧化したうえで、先ずは、地中構造物内の廃棄物の撤去を進めていきます。なお、作業中については、粉じん測定を行うなど、外部へ粉じんが飛散しないよう管理・監視していきます。粉じん測定の環境測定の結果は、ホームページで順次公表していきます。


(令和8年8月)



(令和8年9月)



【施設配置図】

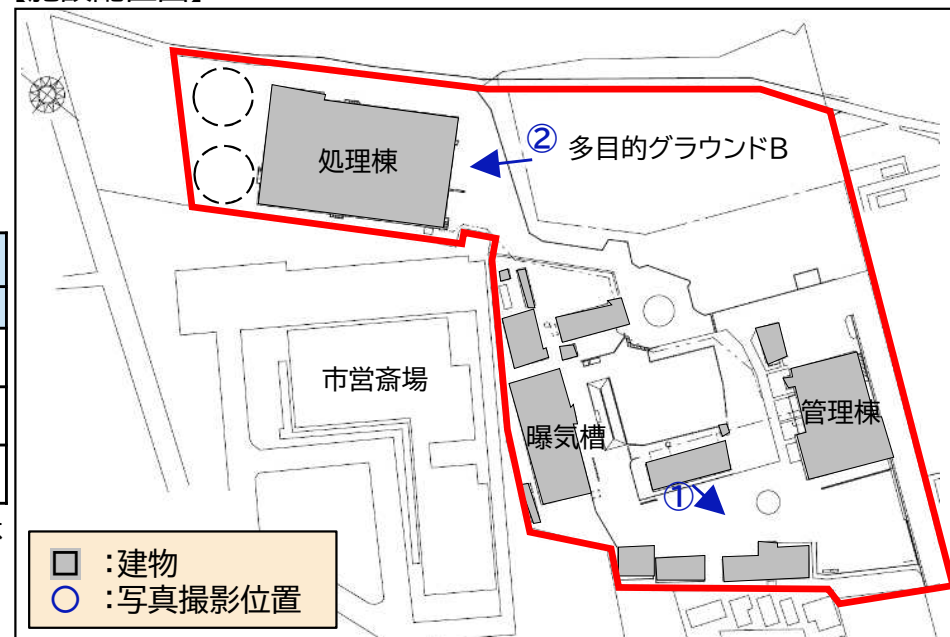


② 処理棟

処理棟(汚泥焼却炉)について、汚泥焼却炉の設備を撤去後、壁面等の洗浄を行い、建屋を解体しました。現在、土間・基礎など地下部分の解体作業を行っています。本敷地内には、大小13の建物(建屋)がありましたが、建物の解体については、全て終了しました。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和8年9月時点）

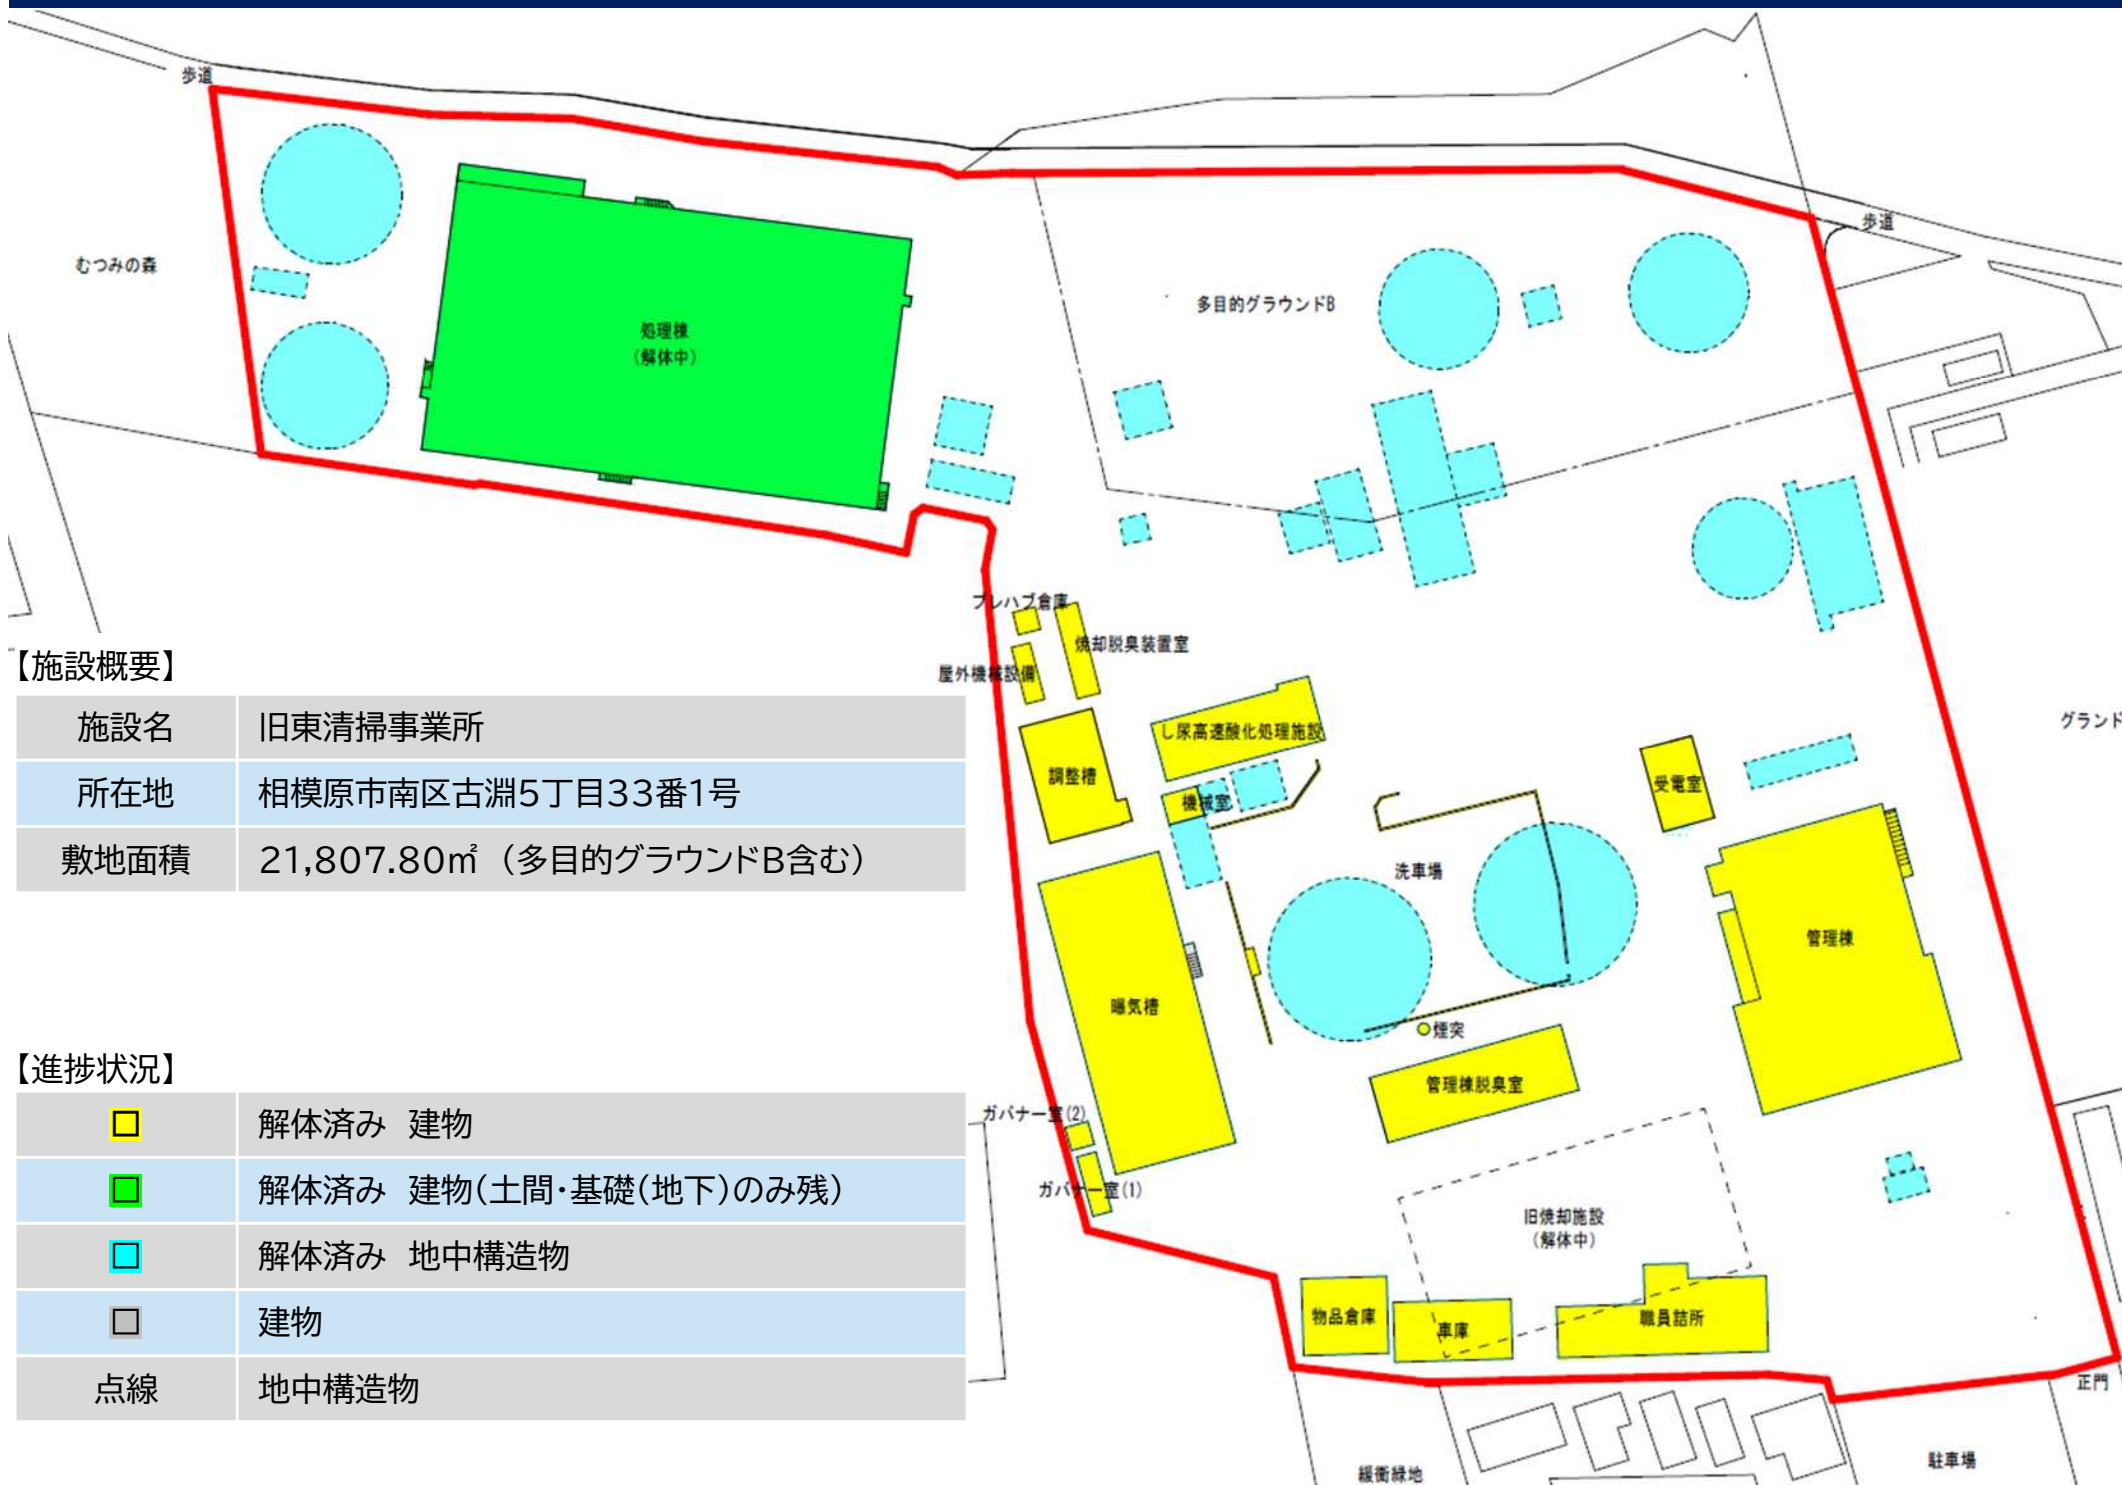

【施設概要】

施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【進捗状況】

■	解体済み 建物
■	解体済み 建物(土間・基礎(地下)のみ残)
■	解体済み 地中構造物
□	建物
点線	地中構造物
